




RENDICION DE CUENTAS




NOMBRE INSTITUCIÓN		CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA DE FUTBOL SAN JUAN			
RUT		65.643.690-5			
NOMBRE RESPONSABLE		alex ayala campos			
CORREO O FONÓ CONTACTO		alexavalacampos@gmail.com 961771997			
CUENTA CONTABLE ASIGNADA		121.06.01.XXX			
CUENTA PRESUPUESTARIA		215.24.01.XXX			
N° DECRETO ALCALDÍCIO		189695			
N° DECRETO DE PAGO		7557			
FECHA INICIO EJECUCION		26-10-2018			
FECHA TERMINO EJECUCION		26-11-2018			
MONTO ASIGNADO		\$ 2.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 2.000.000			
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO		FONDEVE 2017 REPARAMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMARIN N°14 SAN JUAN			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :		MEJORAMIENTO CAMARIN N°14 SAN JUAN			
MONTO POR ITEM ASIGNADO:		2.000.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	18	29-10-18	INSIDE	REPARAMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMARIN N°14 SAN JUAN. ARREGLO WC,LAVAMANOS,CAÑERIAS AGUA POTABLE,CERÁMICA PISO,ILUMINACIÓN,ARREGLO TECHUMBRE,MOBILIARIO.	\$ 1.960.000
2	18	29-10-18	SAN JUAN	APORTE OBLIGATORIO 2 %	\$ 40.000
3					
4					
5					
SUBTOTAL					\$ 2.000.000
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
7					
SUBTOTAL					\$ 0
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8					
9					
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 2.000.000

Nota adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros

Firma del Responsable

CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA
"SAN JUAN"
F. 24/0074 - PERS JUR N° 381

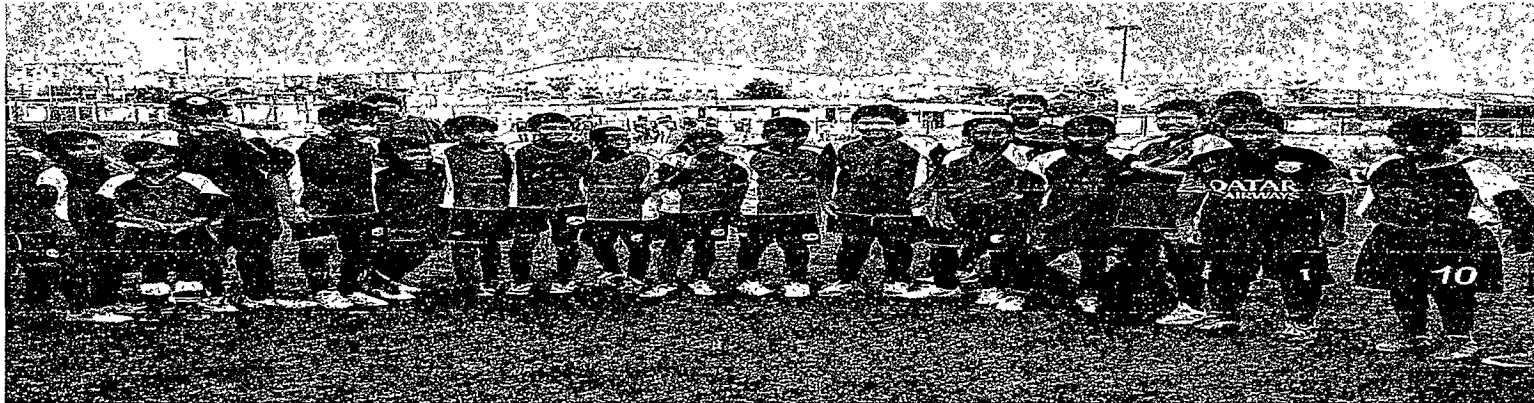

Arica , 14 Diciembre de 2018

Señor(es):

Gerardo Espindola
Alcalde de arica
Presente

Junto con saludar, en mi calidad de representante de **Club Deportivo y academia San Juan**.
Domiciliado en Sergio Flores Ternecier 2071 Rut: 65.643.690-5 fono: 09-986157273.

Hacemos entrega de rendición fondeve año 2018 proyecto reparamiento y mejoramiento
camarín número 14 san juan estadio Carlos dittborn

CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA
"SAN JUAN"
F: 24/06/74 - PERS. JUR N° 381

.....
Rosa Manríquez Millan
Presidenta Academia de Fútbol
San Juan

N° Folio:1.....

VALOR: \$2.000.000.....-

Detalle del Gasto:
REPARAMIENTO
Y MEJORAMIENTO CAMARÍN N°14 SAN JUAN.
ARREGLO WC, LAVAMANOS, CAÑERIAS AGUA
POTABLE, CERÁMICA
PISO, ILUMINACIÓN, ARREGLO
TECHUMBRE, MOBILIARIO.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:2.....

VALOR: \$-

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:3.....

VALOR: \$-

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



SERVICIO DE EVENTOS GIOVANNI MAURICIO BARILE AYALA E.I.R.L.

Giro: EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO OBRAS MENORES EN CONTRUCCION

ROSARIO AGUIRRE 4305 LAS VICU??AS- ARICA
eMail : MBARILE10@GMAIL.COM Telefono : 9 65785857

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.718.102- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº18


S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA SAN JUAN
R.U.T.: 65.643.690- 5
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PEDRO GUERRA 665 GUANACAGUA 3
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARAMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMARÍN N°14 SAN JUAN. ARREGLO WC,LAVAMANOS,CANERIAS AGUA POTABLE,CERÁMICA PISO,ILUMINACIÓN,ARREGLO TECHUMBRE,MOBILIARIO.	1	1.680.672			1.680.672

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.680.672
I.V.A. 19%	\$	319.328
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.000.000

INFORME CUALITATIVO MENSUAL

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN	
RUT	65,643,690-5
ORGANIZACIÓN	organización club deportivo y academia de futbol san juan
PROYECTO	Mejoramiento de camarín para niños, niñas y jóvenes de academia de futbol san juan
REGIÓN	arica y parinacota
PERÍODO RENDIDO Mes y Año	octubre-noviembre 2018


EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN A SUS RESULTADOS Y OBJETIVOS PREVISTOS	
COMPLETE SEGÚN SE VAYAN CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS PREVISTOS, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE CADA MES. ESTE CUADRO DEBE SER IGUAL EN TODOS LOS INFORMES MENSUALES Y SOLO DEBE CAMBIAR SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	
OBJETIVOS PREVISTOS	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS (Objetivo: Completo/ Incompleto/En desarrollo)
1 Retiro de Wc, lavamanos	COMPLETO
2 Retiro de cerámico de muro	COMPLETO
3 Reparación de cañerías agua potable lavamanos y duchas	COMPLETO
4 Instalación de Wc	COMPLETO
5 Instalación de lavamanos	COMPLETO
6 --Instalación cerámico de piso	COMPLETO
7 - Instalación de cerámico de muro	COMPLETO
8 - Iluminación	COMPLETO
9 - arreglo de techumbre	COMPLETO
Nota: Inserte tantas filas como necesite.	

1.- ACTIVIDADES DEL PERÍODO				
Nº DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Debe contener una descripción cualitativa de cada una de)
1	1 Retiro de Wc, lavamanos	26-10-2018	28-10-2018	Se considera el retiro de todos los Wc no pudo ser reutilizado se instalo uno nuevo
2	2. Retiro de cerámico de muro	26-10-2018	28-10-2018	Se considera el retiro de todo cerámico de piso Esto se deberá realizar en forma cuidadosa para no dañar otras estructuras
3	3 Reparación de cañerías agua potable lavamanos y duchas	28-10-2018	01-11-2018	Se deparo red de agua potable de wc lavamanos y duchas

4	4 Instalación de Wc	01-11-2018	03-11-2018	Se instala Wc nuevos, para esto se considera todo el fitting nuevo, sello de cera, pernos de anclaje y silicona alrededor del artefacto
5	5 Instalación de lavamanos	01-11-2018	03-11-2018	se instala lavamanos con pedestal con llave de agua marca Esta instalación considera todo el sistema de desagüe, llave de paso agua marca tipo mariposa para cada artefacto, cañerías de alimentación de agua en cobre tipo L (solo agua fría), además de sifón desagüe
6	6 –Instalación cerámico de piso	03-11-2018	15-11-2018	lsee nivela la superficie mediante mortero para reparaciones , postenormente se instala cerámica antideslizante de 30x30cm, color 29 m2
7	7 - Instalación de cerámico de muro	03-11-2018	15-11-2018	7 3M2 se instala 25x35cm de muro color blanca. pegada con Beckon por todo el contorno del baño, se debio tener total precaución en el pegado de palmetas evitando la acumulación de vacíos, la cantería entre palmetas deberá ser uniforme y no superior a los 5 mm La altura del cerámico en muro será de 1,80mts
8	8 - Iluminación	15-11-2018	20-11-2018	se instalo equipos fluorescentes de 2x36 , estancos Estos fueron instalados en la estructura que soporta el cielo con un mínimo de cuatro tornillos por equipos En esta partida se deben considerar conductores NYA de 1 5mm y canalización en conduit de PVC
9	9 - arreglo de techumbre	20-11-2018	26-11-2018	techumbre 28.12 M2 Instalación de cielo falso deberá ser de plancha de vulcanita enmarcado en vulcometal que debe ir adherido a la estructura viga de fierro que se encuentra en el techo.

APORTE PROPIO PINTURA DE CAMARÍN



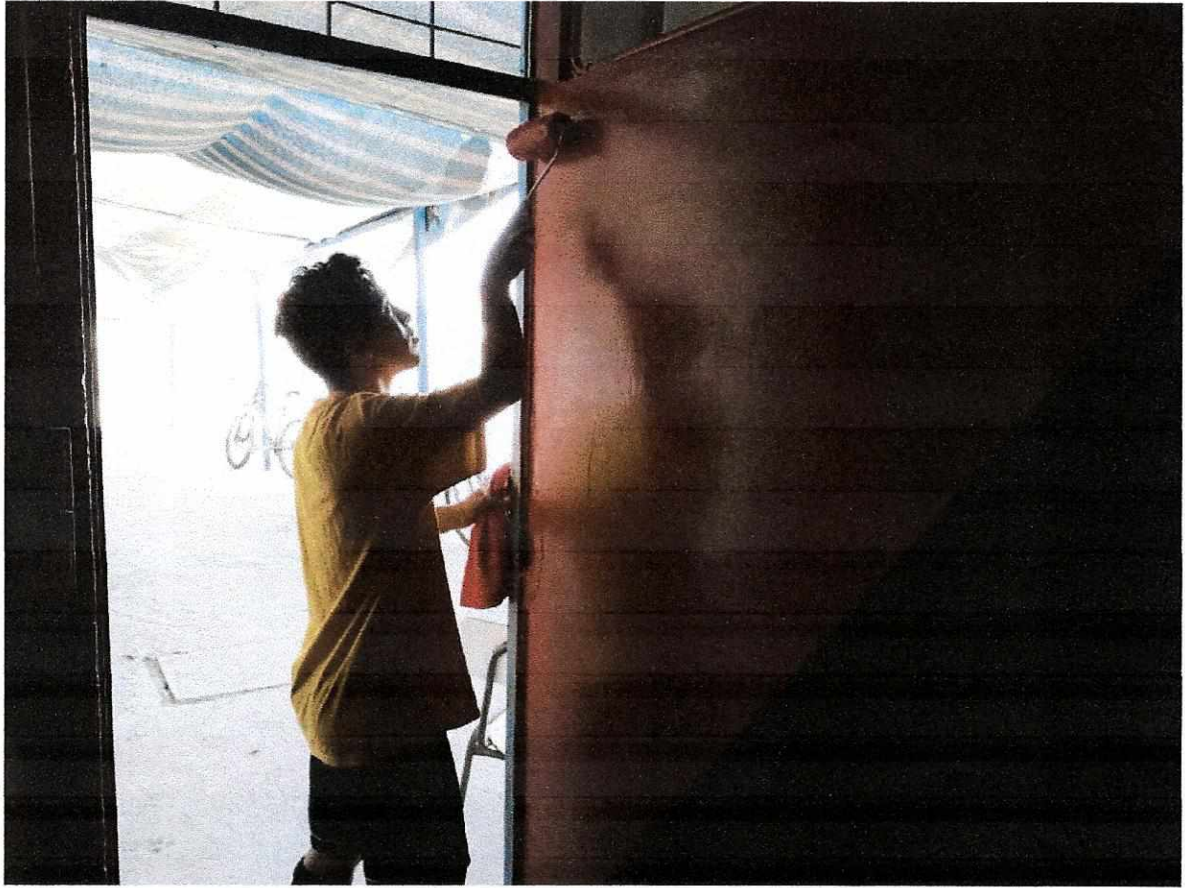

	Informe Fotográfico	Año	2018
		N°	1
Organización academia de futbol San Juan			



Proyecto: MEJORAMIENTO DE CAMARIN PARA NIÑOS NIÑAS Y JOVENES DE ACADEMIA DE FUTBOL SAN JUAN Fondeve 2017		Fecha : 01-12.2018	
		Ciudad : Arica	
<i>Realizado por:</i>	ALEX AYALA		
<i>Cargo:</i>	Coordinador técnico-financiero		



Informe Fotográfico	Año	2018
	N°	1
Organización academia de futbol San Juan		


CAMARÍN N°14 SAN JUAN ANTES DE MEJORAMIENTO



Informe Fotográfico	Año	2018
	Nº	1
Organización academia de futbol San Juan		



	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			

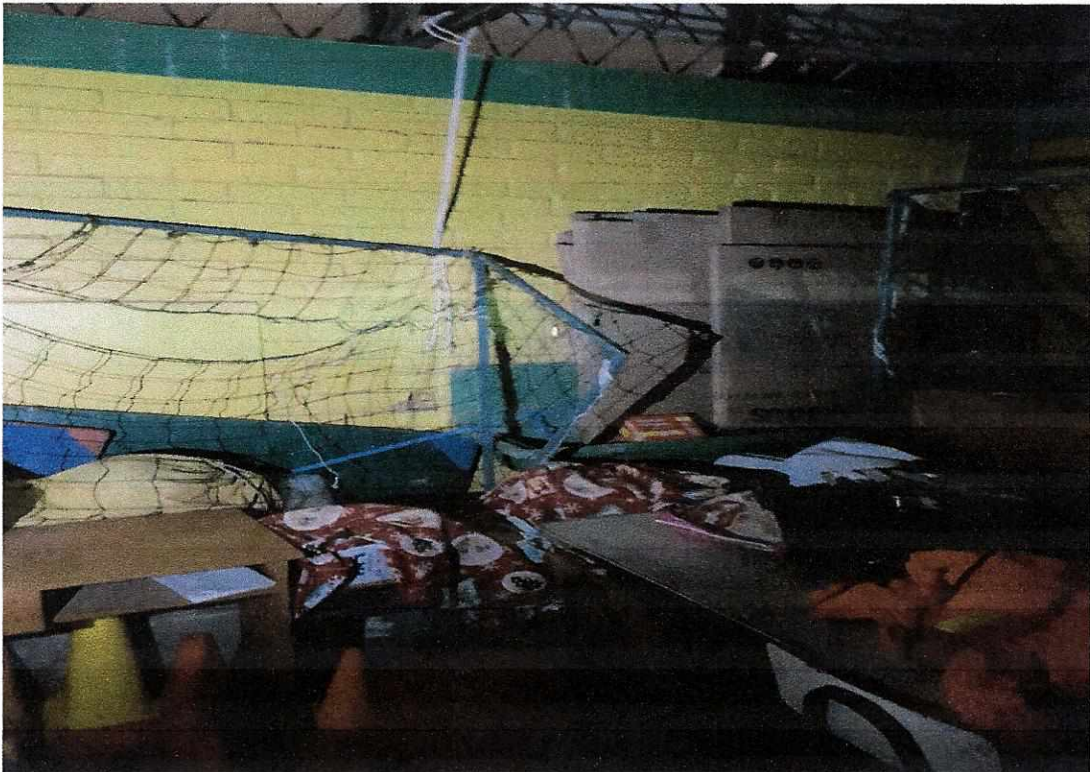

	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			



Informe Fotográfico	Año	2018
	N°	1
Organización academia de futbol San Juan		

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO CAMARÍN N°14 SAN JUAN



Informe Fotográfico	Año	2018
	N°	1
Organización academia de futbol San Juan		



	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			



	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			



	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			



	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			



	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			




	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			

	Informe Fotográfico	Año	2018
		N°	1
Organización academia de futbol San Juan			



Informe Fotográfico	Año	2018
	Nº	1
Organización academia de futbol San Juan		

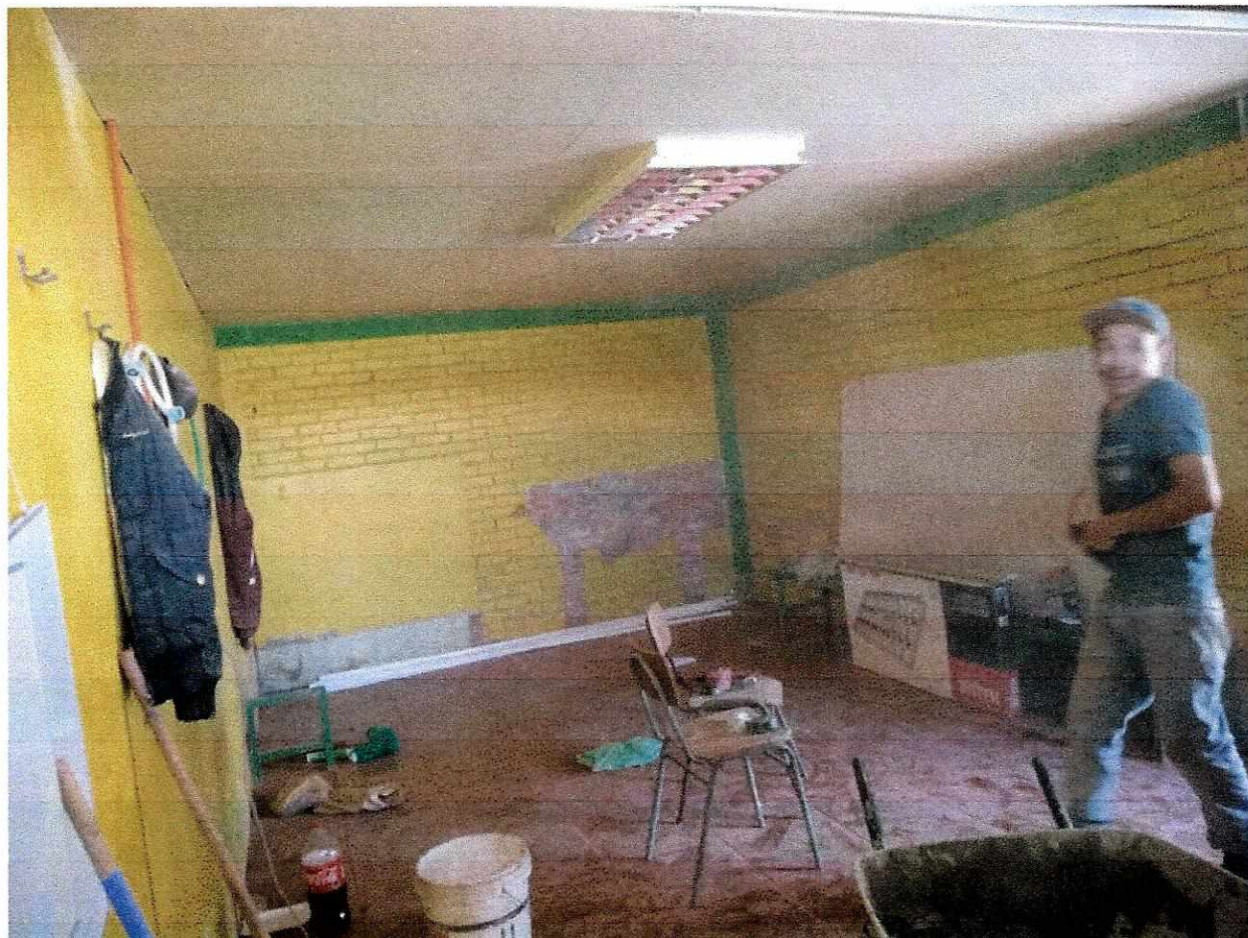

	Informe Fotográfico	Año	2018
		Nº	1
Organización academia de futbol San Juan			



	Informe Fotográfico	Año	2018
		N°	1
Organización academia de futbol San Juan			
