

**RENDICION DE CUENTAS**

|            |             |                |          |                |            |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCION |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|

|                                                  |                                                                                                    |              |                         |                              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>DEPENDENCIA</b>                               | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS<br>O.C.A.E.M                        |              |                         |                              |              |
| <b>NOMBRE RESPONSABLE</b>                        | MIRTHA JORQUERA SAINES                                                                             |              |                         |                              |              |
| <b>RUT</b>                                       | 7.286.890-0                                                                                        |              |                         |                              |              |
| <b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>                   | <a href="mailto:mirthajorquerasaines@gmail.com">mirthajorquerasaines@gmail.com</a>                 |              |                         |                              |              |
| <b>CUENTA ASIGNADA</b>                           | 1210601171                                                                                         |              |                         |                              |              |
| <b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>                     | 13626                                                                                              |              |                         |                              |              |
| <b>N° DECRETO DE PAGO</b>                        | 6082                                                                                               |              |                         |                              |              |
| <b>FECHA INICIO EJECUCION</b>                    | 21-12-2016                                                                                         |              |                         |                              |              |
| <b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>                   | 29-12-2016                                                                                         |              |                         |                              |              |
| <b>MONTO ASIGNADO</b>                            | \$ 6.000.000                                                                                       |              |                         |                              |              |
| <b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>                      | \$ 0                                                                                               |              |                         |                              |              |
| <b>MONTO RENDIDO</b>                             | \$ 6.000.000                                                                                       |              |                         |                              |              |
| <b>REINTEGRO</b>                                 | \$ 0                                                                                               |              |                         |                              |              |
| <b>SALDO PENDIENTE</b>                           | \$ 0                                                                                               |              |                         |                              |              |
| <b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>  | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1° ETAPA CIERRE PERIMETRAL SOLIOO PARA GRANJA AGRICOLA EN VILLA FRONTERA |              |                         |                              |              |
| <b>DETALLE DE RENDICION</b>                      |                                                                                                    |              |                         |                              |              |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> | INFRAESTRUCTURA                                                                                    |              |                         |                              |              |
| <b>CUENTA N°:</b>                                |                                                                                                    |              |                         |                              |              |
| <b>SUB ITEM N°: 1</b>                            |                                                                                                    |              |                         |                              |              |
| <b>N°</b>                                        | <b>N° Boleta /Factura</b>                                                                          | <b>Fecha</b> | <b>Proveedor</b>        | <b>Detalle</b>               | <b>Valor</b> |
| 1                                                | 112                                                                                                | 23-12-16     | RODRIGO CAMPOS ESCUDERO | INSTALACION CERCO PERIMETRAL | \$ 6.000.000 |
| <b>Total</b>                                     |                                                                                                    |              |                         |                              | \$ 6.000.000 |

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

29-12-2016

Nº FOLIO 1

VALOR \$ 6.000.000.-

**Rodrigo Andrés Campos Escudero**  
CONTRATISTA EN OBRAS MENORES,  
PROYECTOS Y PLANOS DE INGENIERÍA

**"INGEPRO"**

Pasaje 6 N° 3480 - Población Juan Pablo II  
Arica - Chile

R.U.T.: 13.019.298-K  
**FACTURA**

Nº 000112

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

|                  |                                                     |                 |       |        |             |     |    |     |      |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|-----|----|-----|------|
| SEÑOR(ES)        | Organización Comunitaria de Ayudz Enfermos Mentales |                 |       | DÍA    | 23          | MES | 12 | AÑO | 2016 |
| DIRECCIÓN        | Almirante Latorre # 1175                            |                 |       | R.U.T. | 7.851.000-7 |     |    |     |      |
| GIRO             | Organización                                        |                 |       | CIUDAD | Arica       |     |    |     |      |
| GUIA DESPACHO N° | CONDICIONES DE VENTA                                | ORDEN DE COMPRA | FONOS |        |             |     |    |     |      |

Por lo siguiente: a **RODRIGO ANDRES CAMPOS ESCUDERO** DEBE

| Cantidad | DETALLE                                                                                                                                    | Precio Unitario | TOTAL     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | Instalacion de Cerco Perimetral<br>de Placas de Hormigon prefabricado<br>(Pandereto) en un Largo total 132ml<br>segun presupuesto 404/0216 | —               | 5.042.017 |
|          | Ubicacion Villa frontera<br>calle San Martin Lote A-17                                                                                     | 7               |           |

Son: ..... s.e.u.o.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                    |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s) | Nombre: <u>Piriz Jonyuenz</u>  | CANCELADO<br><br>23 De Dic de 2016 | NETO \$       | 5.042.017 |
|                                                                                                                                                                                                                            | RUT: <u>7.851.000-7</u>        |                                    | 19% I.V.A. \$ | 957.983   |
|                                                                                                                                                                                                                            | Recinto: <u>Latorre # 1175</u> |                                    | TOTAL \$      | 6.000.000 |
| Fecha: <u>23.12.16</u>                                                                                                                                                                                                     | Firma: <u>[Signature]</u>      |                                    |               |           |



## **INFORME DE OBRA**

**Obra:** Instalación de cerco perimetral de placas de hormigón

**Mandante:** organización comunitaria de ayuda a enfermos mentales crónicos

**Contratista:** Rodrigo Campos Escudero

### **Descripción de la obra**

La obra consistió en proveer e instalar un cerco perimetral de placas de hormigón prefabricada (panderetas) en un largo total de 132 metros lineales según presupuesto 404/0216 .-

### **Materiales utilizados**

1.-Postes de hormigón 2,65mt – cant. 66 und.

2.-Placas de hormigón 2,0 x 0,5 x 0,035 – cant. 264 und.

Estos materiales fueron comprados en la empresa Bottai (material certificado)

3.- aridos – arena y ripio

4.- cemento

5.-insumos varios

### **Desarrollo del trabajo**

1.- trazado y nivelación de terreno

2.-excavaciones 0,5 x 0,5 x 0,65 de profundidad, cantidad 66

3.-instalacion de pilares, para la instalación de los pilares de utilizo hormigón H25 hecho en obra

4.- instalación de placas, pata la instalación de las placas se utilizo trípode con poleas( pateca)


5.-sellado y fijación de placas, para la fijación y sellado de utilizo mezcla de cemento y arena (2:1)

### **Tiempo de ejecución de la obra**


**Inicio:** 28 – noviembre – 2016



**Termino:** 21 – diciembre – 2016

Tiempo aproximado de ejecución de la obra 15 días

  
Rodrigo Campos Escudero

13.019.298-k

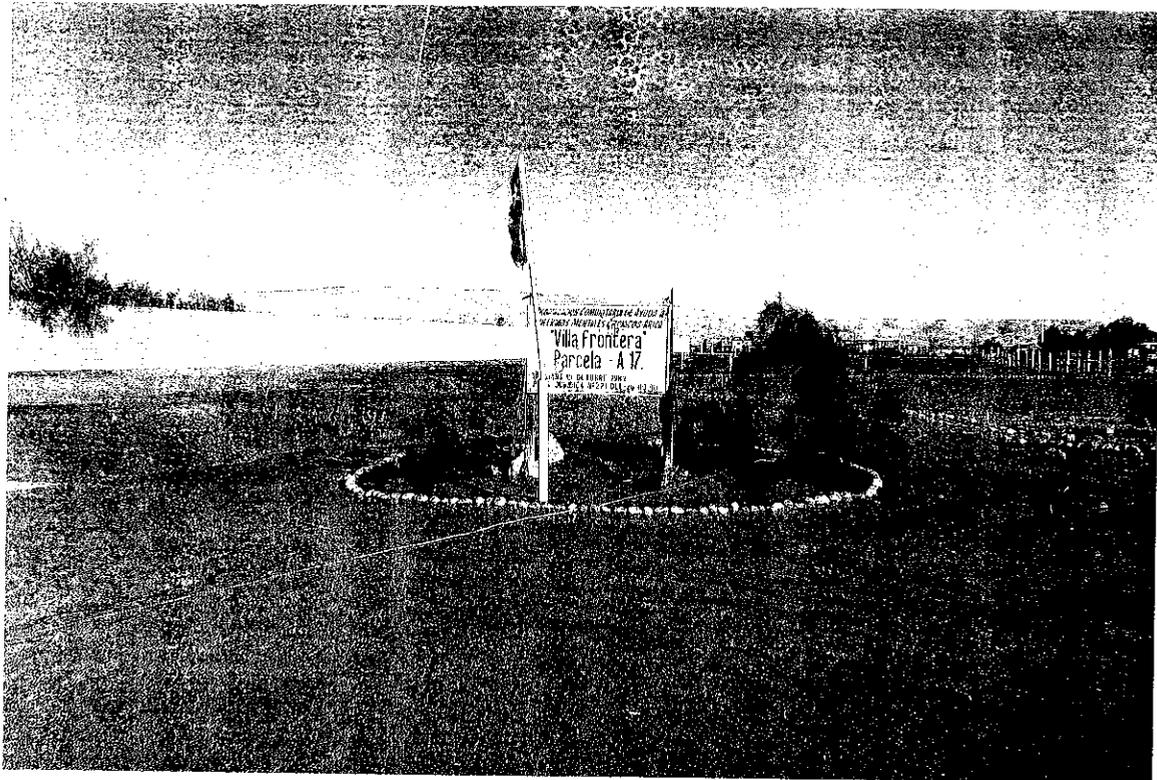

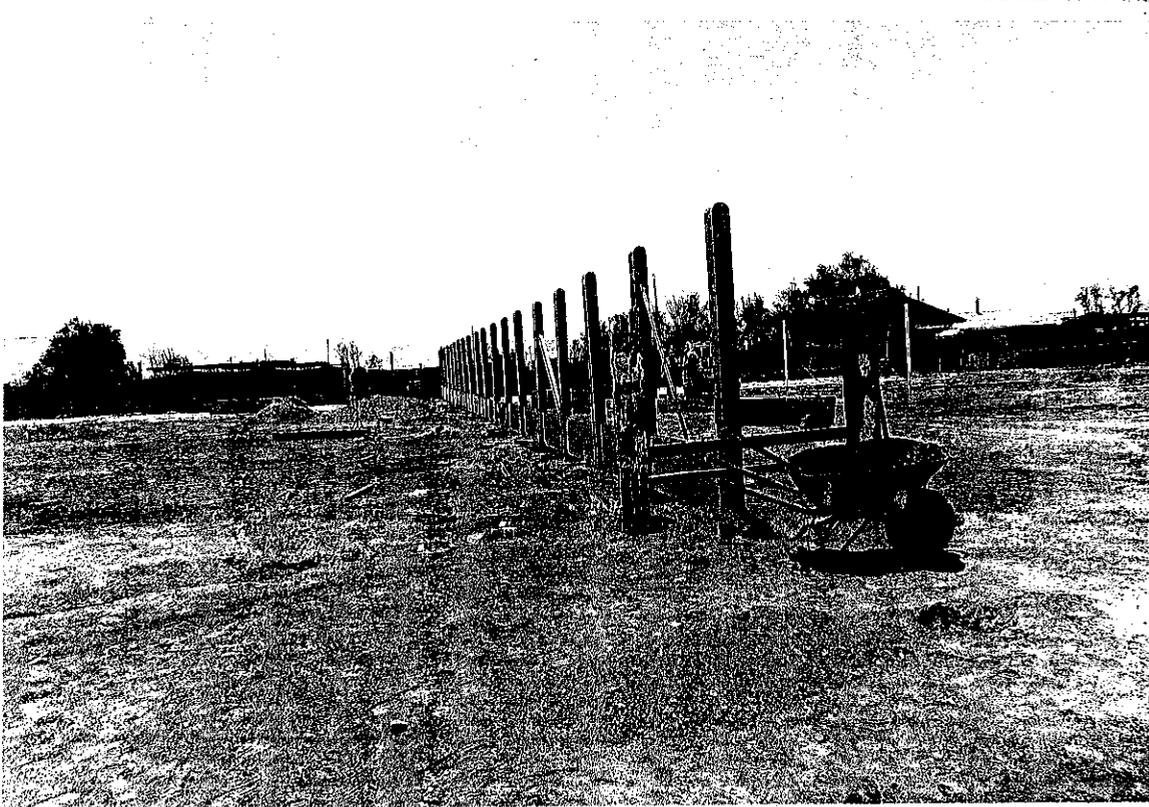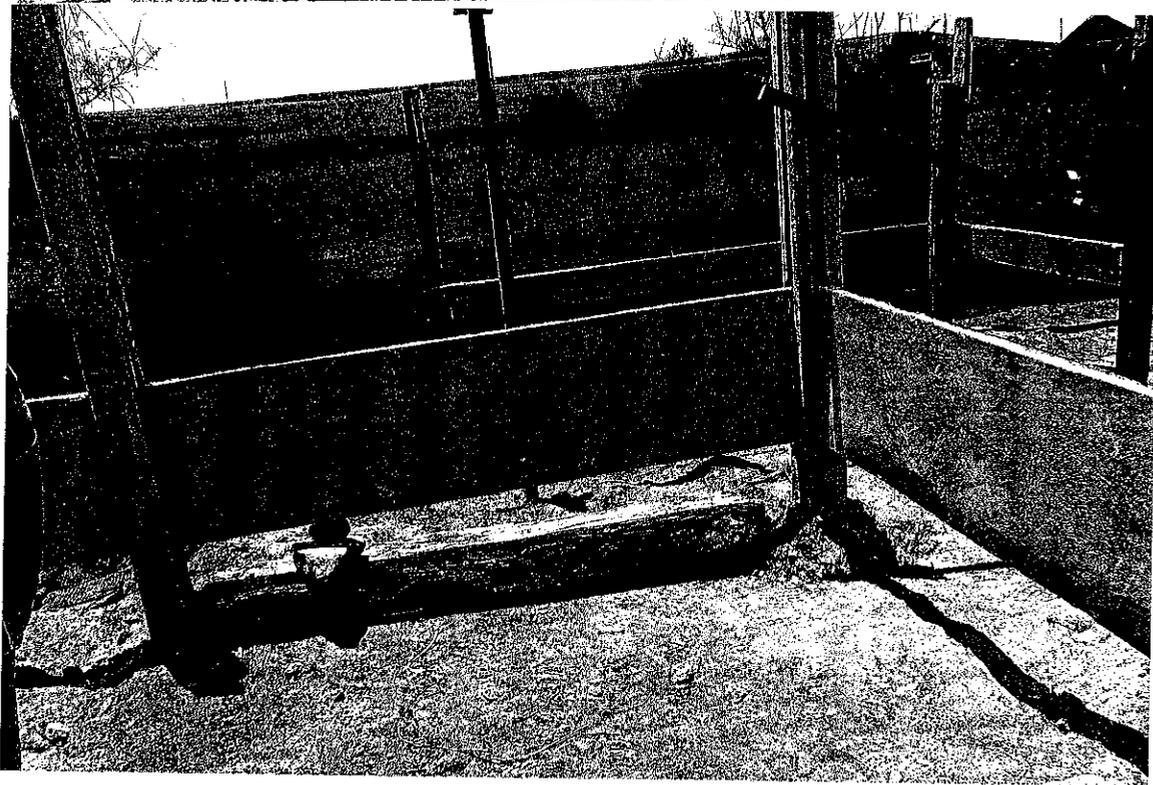

# INSTALACION DE CIERRE PERIMETRAL



## CONSTANCIA

**ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS** hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de DICIEMBRE 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 13 de Diciembre del 2016.

  
  
**JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ**  
**SOPORTE TÉCNICO**  
**I.M.A.**

cc  
**Soporte Técnico**  
Contraloría
